


		2019年												2020年											
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
3系1期 水処理施設	遮水材置換	[Bar]																							
	基礎杭	[Bar]																							
	棧橋設置						[Bar] 棧橋杭、中間杭							[Bar] 棧橋設置											
	障害物撤去/掘削工											[Bar]													
	杭頭処理												[Bar]												
	躯体構築												[Bar]												
配管廊、 導水渠、 排流渠工事	3系敷地内	[Bar] 汚染土撤去								[Bar] 鋼矢板打設、掘削工、躯体構築															
	道路部	[Bar] 準備工事												[Bar] 鋼矢板打設、覆工架設、掘削、構築											
分配槽立坑工事						[Bar] アンカー打設 躯体構築、圧入、掘削																			
シールド工事																					[Bar] シールド設備工				
ポンプ棟立坑工事											[Bar] 準備工事、地盤改良工事 掘削工事												[Bar] 躯体構築		
環境モニタリング	[Bar]																								

4.1.今後の予定（水処理施設）

2～3次掘削

2019年12月
～2020年3月（予定） 汚染土拡散防止対策

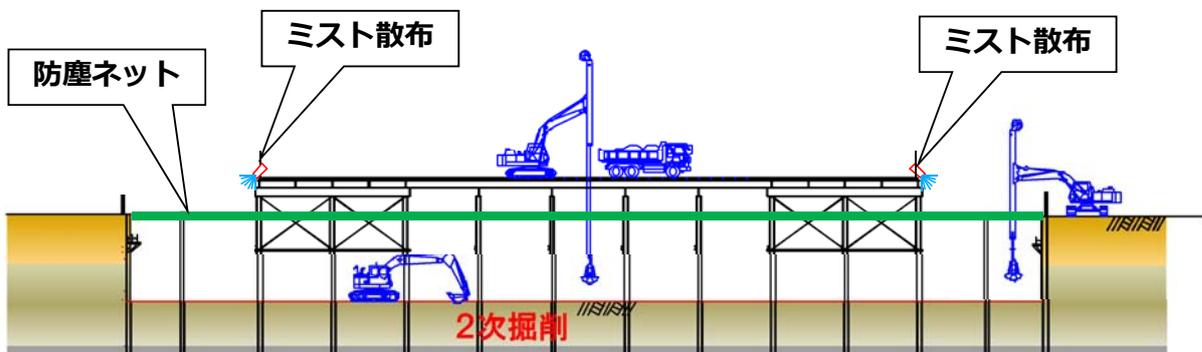


《掘削土運搬》 粉塵対策 **飛散防止シート** 場内 場外



躯体工

2020年3月
～2022年10月（予定）

- ・鉄筋工事
- ・型枠工事
- ・コンクリート打設工事
- ・足場工事

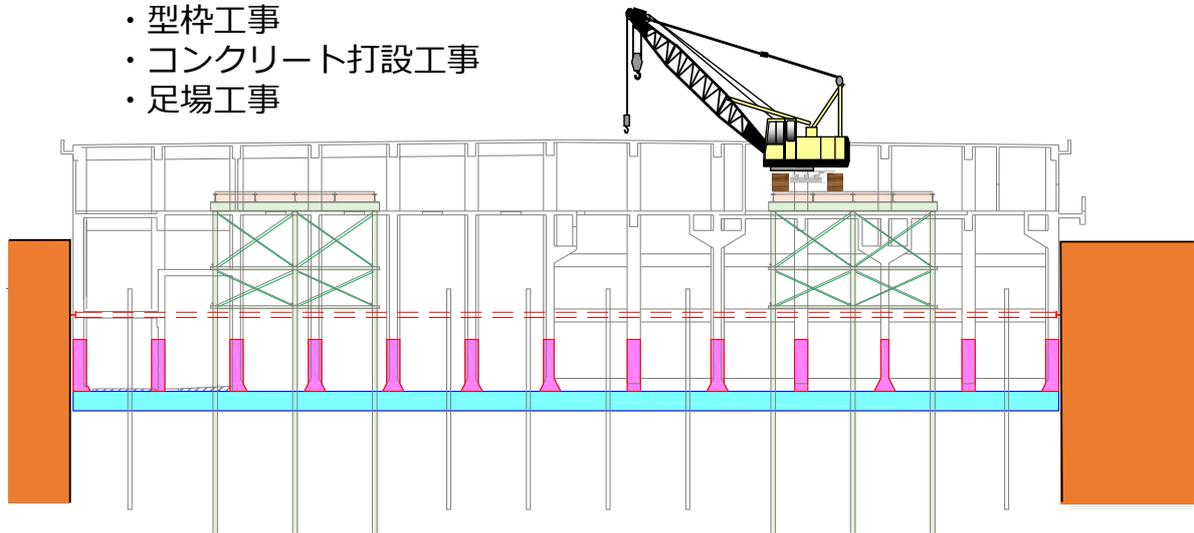


4.2.今後の予定（分配槽立坑）

分配槽立坑（オープンケーソン工法）


2019年6月
～2020年9月（予定）

- ① 圧入設備セット
- ② 掘削・圧入,躯体
- ③ 立坑構築完了

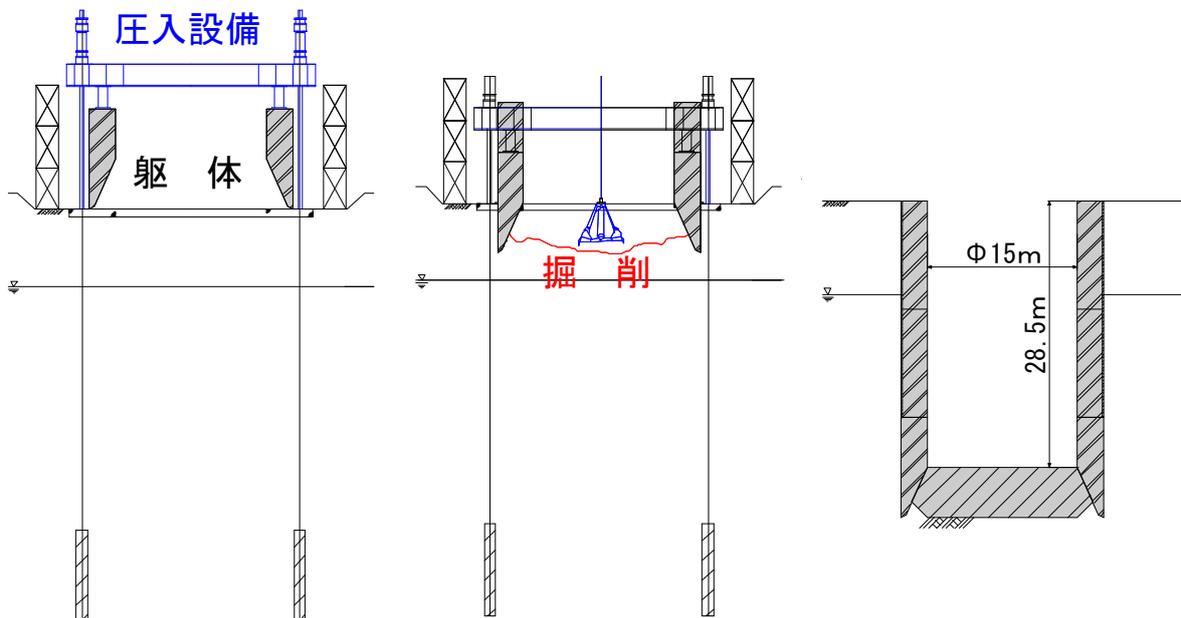


～4-1.道路横断部の工事～ (下水道科学館北側道路付近)

4-1-1. 道路横断部工事概要

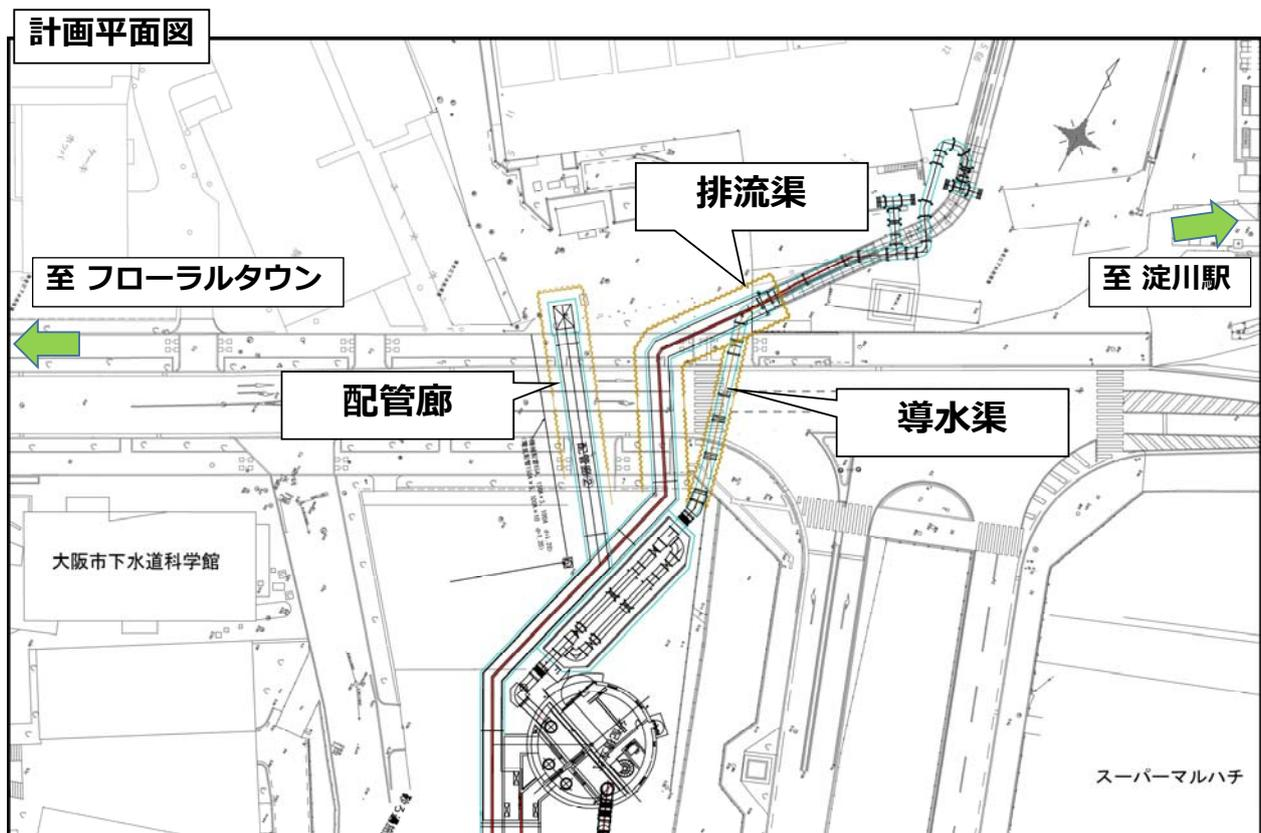


計画断面図

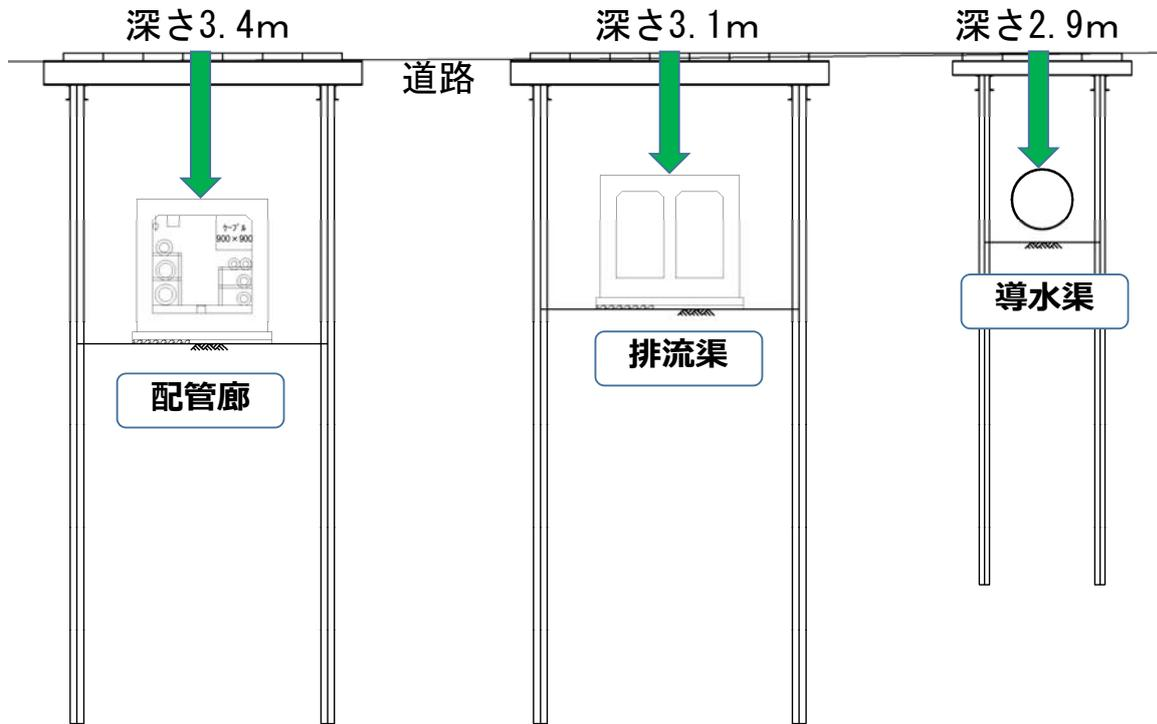



1. 横断歩道・信号を移設

3. 処理場のゲート移動



2. 工事用ゲートを新設

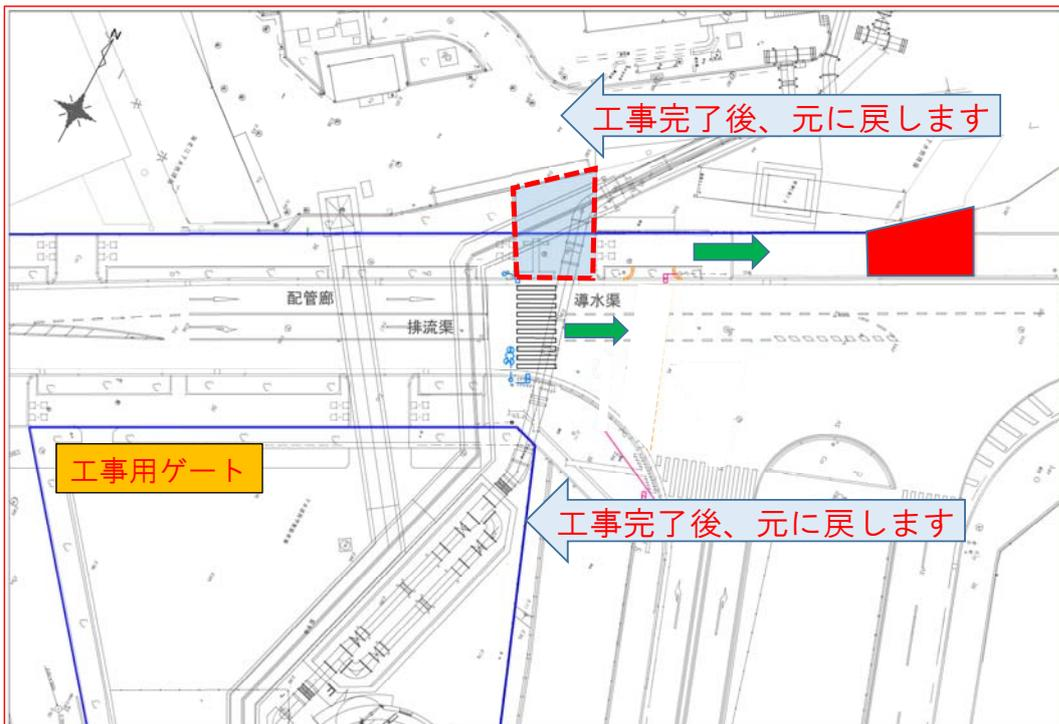

3. 歩道・車道のかたちと位置が変わります（4パターン）

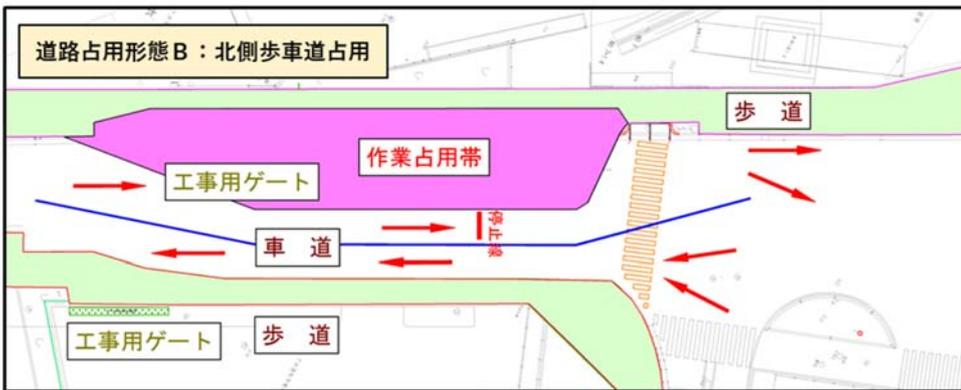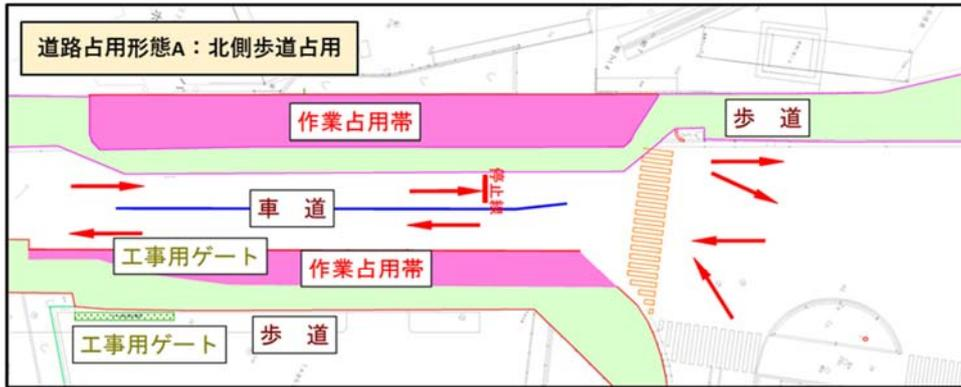


3. 歩道・車道のかたちと位置が変わります（4パターン）

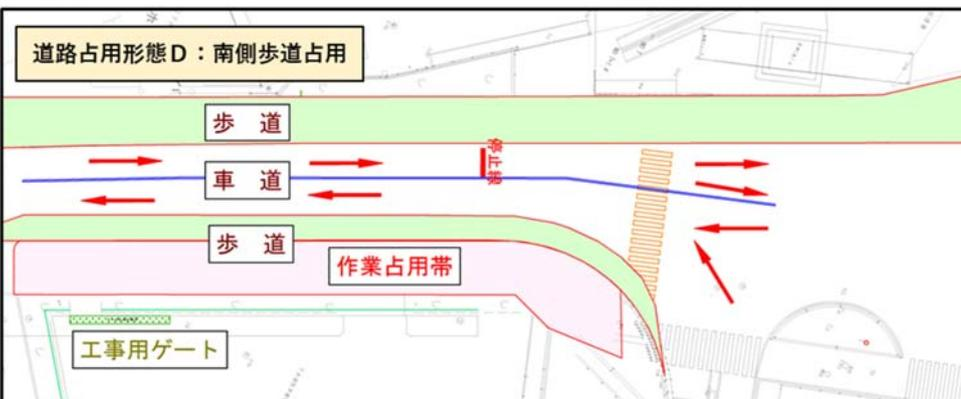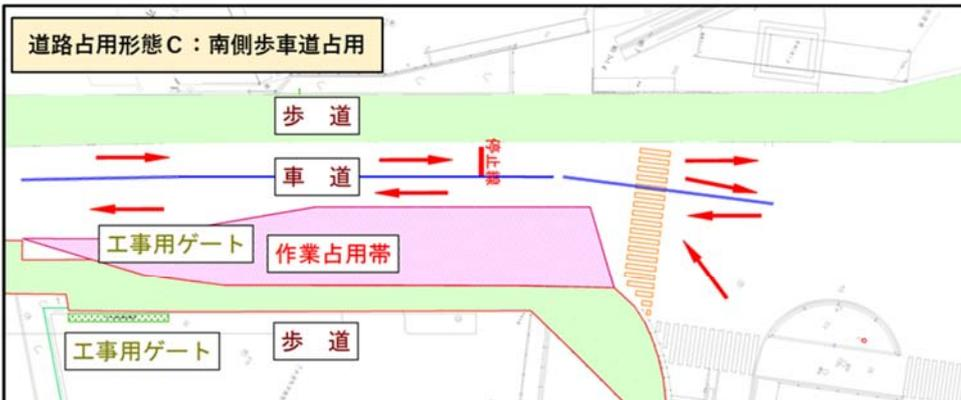

4-2-1.ポンプ棟立坑工事概要

44

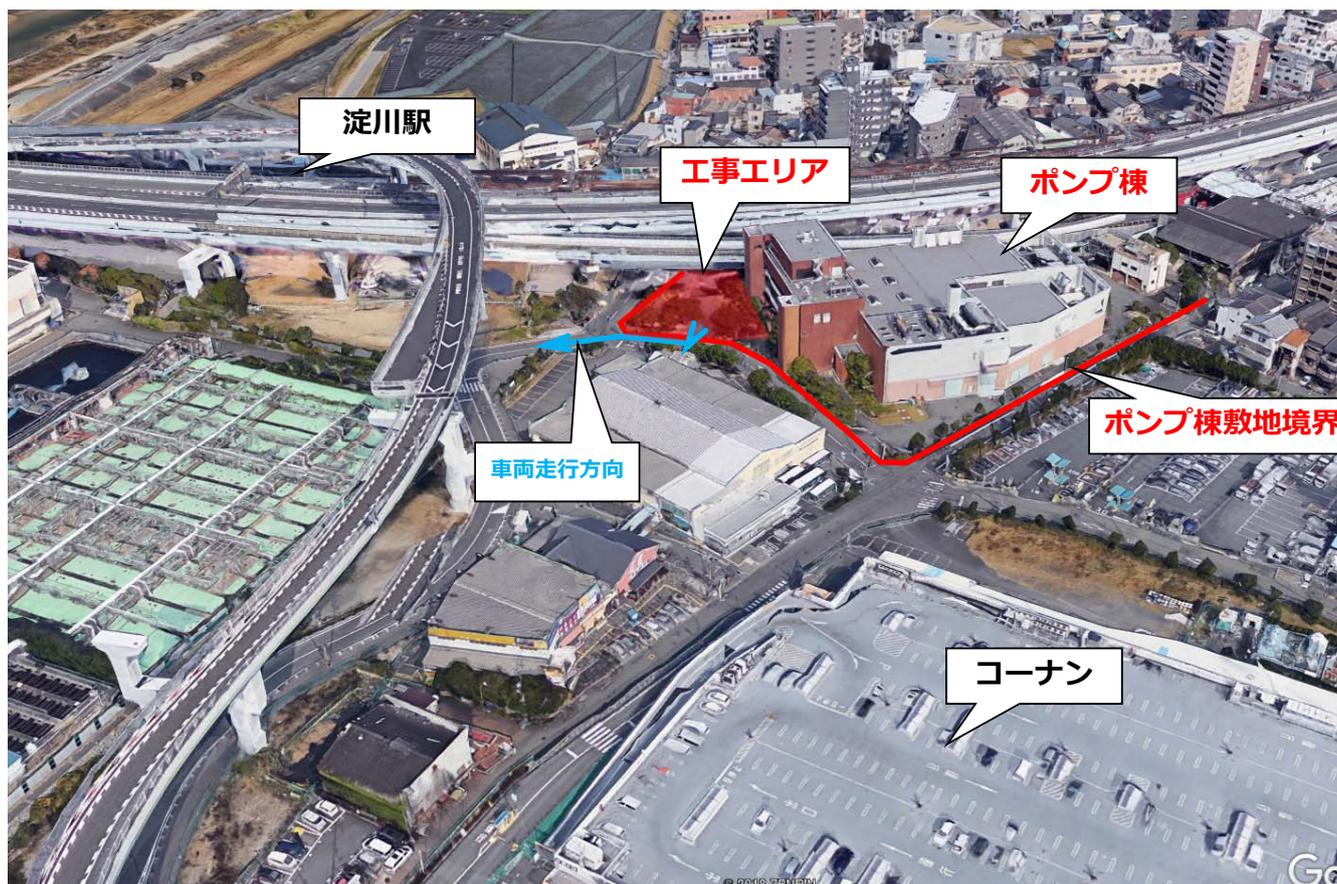

4-2-2.ポンプ棟立坑工事概要

45



～5.その他～

地域住民の皆様へ

地域の皆さまとの交流の場

コミュニケーションルーム 2018年9月開設

- ・ 工事の**工程表**や**進捗写真**の掲示
- ・ 環境モニタリング測定値の**リアルタイム表示**
- ・ 工事に関するご意見,ご要望を伺う**ご意見箱**の設置
- ・ 現場を見渡せる**見学台**の設置



ホームページの開設

- ・ 当事業に関するホームページを開設しています。



<http://www.ebie-waterlink.com/contents/>

- ・ 事業説明,工程表,工事通信,お問合せ窓口等の情報を掲載しています。



こちらのQRコードからもホームページにアクセス可能です

海老江ウォーターリンク 作業所連絡先

Tell:06-6131-9626
