


管理値超過時の記録シート

10月30日

時間	L _{A5,1h} (dB)	管理値			日時	L _{A5,1h} (dB)	管理値			日時	L _{A5,1h} (dB)	管理値		
		1次	2次	自主			1次	2次	自主			1次	2次	自主
11:03	77.5	○			11:57	77.6	○							
11:04	78.3	○			11:58	77.6	○							
11:05	78.3	○			11:59	77.5	○							
11:06	78.3	○			12:00	77.0	○							
11:07	78.3	○			12:01	74.1	○							
11:08	78.3	○												
11:09	78.3	○												
11:10	78.3	○												
11:11	78.3	○												
11:12	78.3	○												
11:13	78.3	○												
11:14	78.3	○												
11:15	78.3	○												
11:16	78.3	○												
11:17	78.3	○												
11:18	78.3	○												
11:19	78.3	○												
11:20	78.3	○												
11:21	78.3	○												
11:22	78.3	○												
11:23	78.3	○												
11:24	78.3	○												
11:25	78.3	○												
11:26	78.3	○												
11:27	78.3	○												
11:28	78.3	○												
11:29	78.3	○												
11:30	78.3	○												
11:31	78.3	○												
11:32	78.3	○												
11:33	78.3	○												
11:34	78.3	○												
11:35	78.3	○												
11:36	78.3	○												
11:37	78.3	○												
11:38	78.1	○												
11:39	78.0	○												
11:40	78.0	○												
11:41	77.9	○												
11:42	77.9	○												
11:43	77.9	○												
11:44	77.9	○												
11:45	77.9	○												
11:46	77.9	○												
11:47	77.9	○												
11:48	77.9	○												
11:49	77.9	○												
11:50	77.9	○												
11:51	77.9	○												
11:52	77.9	○												
11:53	77.9	○												
11:54	77.8	○												
11:55	77.8	○												
11:56	77.7	○												

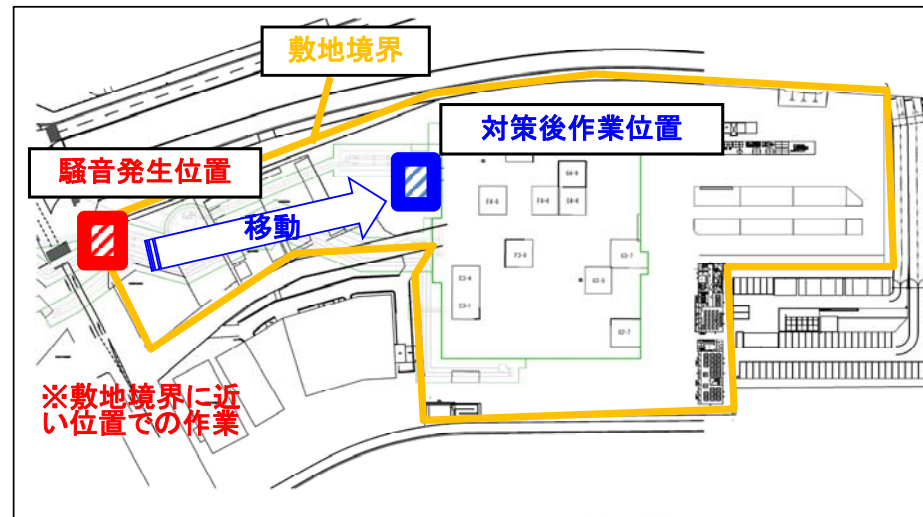

管理値超過地点	敷地境界 北側
管理値超過項目	騒音
工事による超過か	○
基本対策は実施されているか	○
測定機器は正常に動作しているか	○

※自主管理値超過時は、工事を中断し大阪市北部方面
管理事務所へ連絡を行うこと。

TEL : 06-6462-1460 (平日)
06-6462-1434 (代表)



管理値超過時状況	大阪市下水道科学館（旧）駐車場（敷地境界北側近傍）で、コンクリートガラの小割り撤去作業を行っていた。コンクリートガラの小割り作業音が騒音の発生源と考えられる。基本対策として、作業エリア周辺に防音シートを設置し作業を行っていた。
対策内容	ポータブル騒音計を用いて、音源の確認と計測機器の異常がないかを確認。音源がコンクリートガラの小割り作業音ということが確認できたため、レベル1対策を実施。レベル1対策の内容：コンクリートガラの小割り作業を敷地境界から20m以上離して実施。結果、騒音レベルは1次管理値以下に下がった。

その他・備考	特になし
--------	------
